
Status realizacji projektu oraz harmonogram kolejnych prac

Andrzej Zadworny

Konstancin-Jeziorna | ClickMeeting | 17 kwietnia 2024 r.

www.pse.pl


| Wykonawca CSIRE



27.01.2023 r. PSE zawarły umowę na wdrożenie CSIRE z Konsorcjum CGI

Plan wdrożenia CSIRE

- ⊕ Plan wdrożenia CSIRE określa listę zadań niezbędnych do uruchomienia CSIRE z uwzględnieniem terminów określonych przepisami prawa.
- ⊕ Plan jest aktualizowany i uzupełniany w miarę postępu prac projektowych – ostatnia aktualizacja została opublikowana 23.01.2024 r. i jest dostępna pod adresem: <https://www.pse.pl/oire/plan-wdrozenia-csire>
- ⊕ Plan prezentuje harmonogram zadań wymaganych do wdrożenia CSIRE, w podziale na trzy strumienie prac:
 - Działania formalnoprawne
 - Migracja danych inicjalnych do CSIRE
 - Budowa, testowanie i uruchomienie CSIRE

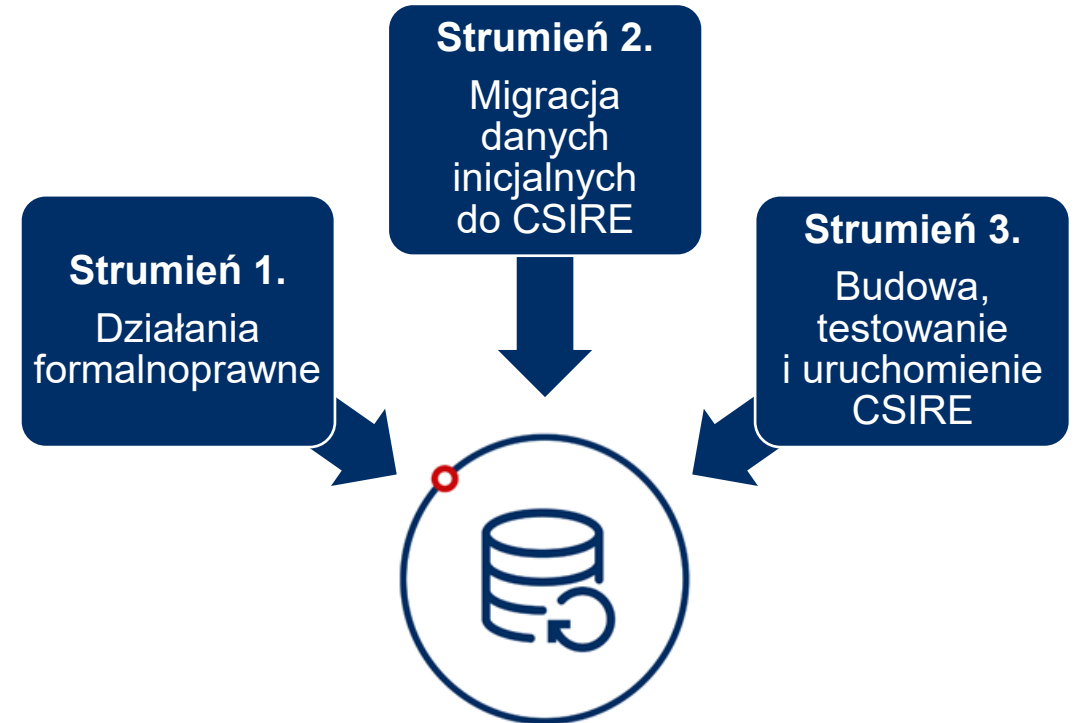

Plan wdrożenia CSIRE

Strumień 1: Działania formalnoprawne (wybrane zadania)

Kod	Zadanie	Termin realizacji	Status
S1.14	Zawarcie z OIRE umów na korzystanie z CSIRE.	od 1.07.2023 r. do 3.04.2024 r.	zrealizowane
S1.11 S1.12	IRiESP-OIRE (2.0): publikacja, konsultacje, przedłożenie do zatwierdzenia przez Prezesa URE.	od 29.11.2023 r. do 31.01.2024 r.	zrealizowane
S1.13	Zatwierdzenie przez Prezesa URE IRiESP-OIRE wersja 2.0.	od 1.02.2024 r. do 30.04.2024 r.*	w realizacji
S1.16	TSKB zgodne z IRiESP-OIRE 2.0: publikacja, konsultacje, opublikowanie zatwierdzonych przez OIRE TSKB.	od 31.01.2024 r. do 15.03.2024 r.	zrealizowane
S1.18 S1.19	Publikacja IRiESP-OIRE (2.5): publikacja, konsultacje, przedłożenie do zatwierdzenia przez Prezesa URE.	od 16.05.2024 r. do 17.07.2024 r.	planowane
S1.20	Zatwierdzenie przez Prezesa URE IRiESP-OIRE wersja 2.5.	od 18.07.2024 r. do 30.09.2024 r.*	planowane
S1.21	TSKB zgodne z IRiESP-OIRE 2.5: publikacja, konsultacje, opublikowanie zatwierdzonych przez OIRE TSKB.	od 23.05.2024 r. do 28.06.2024 r.	zrealizowane

* Wskazany termin ma charakter poglądowy, jest niezależny od OIRE i leży wyłącznie w gestii URE.

Plan wdrożenia CSIRE

Strumień 2: Migracja danych inicjalnych do CSIRE (wybrane zadania)

Kod	Zadanie	Termin realizacji	Status
S2.1	Zakres danych inicjalnych CSIRE: wersja 1 (SWI 5.0), wersja 2 (SWI 5.3), wersja 3 (IRiESP-OIRE 2.5, TSKB z 15.03.2024 r.)	od 28.12.2021 r. do 31.03.2024 r.	zrealizowane
S.2.4.1	Budowa oraz udostępnienie Narzędzia Migracji Danych	od 27.06.2022 r. do 31.03.2023 r.	zrealizowane
S.2.6	Weryfikowanie jakości danych inicjalnych CSIRE	od 7.04.2023 r. do 31.04.2024 r.	w trakcie
S.2.7	Przekazanie kompletnych informacji o PP	od 1.09.2024 r. do 3.10.2024 r.	planowane
S.2.8	Budowa wsadu inicjalnego CSIRE	od 4.10.2024 r. do 16.06.2025 r.	planowane
S.2.9	Zasilenie inicjalnego CSIRE	od 17.06.2025 r. do 30.06.2025 r.	planowane

Plan wdrożenia CSIRE

Strumień 3: Budowa, testowanie i uruchomienie CSIRE (wybrane zadania) – cz. 1

Kod	Zadanie	Termin realizacji	Status
S3.4	Publikacja wymagań technicznych w zakresie interfejsów wymiany danych	od 31.05.2023 r. do 31.03.2024 r.	w trakcie
S3.5	Budowa CSIRE, w tym testy FAT	od 18.07.2023 r. do 31.08.2024 r.	w trakcie
S3.6	Uruchomienie CSIRE, w tym testy SAT	od 21.11.2023 r. do 30.04.2025 r.	w trakcie
S3.10	Testy techniczne integracji systemów IT Użytkowników zewnętrznych z CSIRE (testy z dwoma użytkownikami zakończone sukcesem)	od 1.02.2024 r. do 31.05.2024 r.	w trakcie
S3.12	Pilotaż rynkowy I, w tym certyfikacja i przyłączenie systemów IT	od 17.09.2024 r. do 30.11.2024 r.	planowane
S3.13	Pilotaż rynkowy II, w tym certyfikacja i przyłączenie systemów IT	od 15.11.2024 r. do 20.02.2025 r.	planowane
S3.14	Pilotaż rynkowy III, w tym certyfikacja i przyłączenie systemów IT	od 5.02.2025 r. do 5.05.2025 r.	planowane

Plan wdrożenia CSIRE

Strumień 3: Budowa, testowanie i uruchomienie CSIRE (wybrane zadania) – cz. 2

Kod	Zadanie	Termin realizacji	Status
S3.17	Certyfikacja systemów IT Użytkowników profesjonalnych przyłączanych do CSIRE na potrzeby uruchomienia produkcyjnego	od 19.05.2025 r. do 13.06.2025 r.	planowane
S3.7	Przyłączenie systemów IT Użytkowników profesjonalnych (oraz NF) do CSIRE na potrzeby uruchomienia produkcyjnego	od 26.05.2025 r. do 20.06.2025 r.	planowane
S3.8	Uruchomienie produkcyjne CSIRE	1 lipca 2025 r.	planowane
S3.19	Asysta po starcie produkcyjnym	od 1.07.2025 r. do 31.08.2025 r.	planowane

| Wydania CSIRE

WYDANIE 1

1 lipca 2025 r.

Procesy rynku energii

WYDANIE 2

II połowa 2026 r.


Integracja CSIRE z systemami
IT OSP wspierającymi
Rynek bilansujący

WYDANIE 3

II połowa 2027 r.

Rozszerzenie funkcjonalności
CSIRE

Plan szkoleń

Temat	Termin	Forma szkolenia/miejsce	Status
Warsztaty ogólne: informacje prawne, podstawowe informacje biznesowe nt. CSIRE, systemy informacyjne	17.04.2024 r. w godz. 9.00-17.00	stacjonarnie w siedzibie PSE w Konstancinie-Jeziornie oraz on-line na platformie ClickMeeting	
Procesy CSIRE w pigułce - warsztaty dla przedstawicieli podmiotów funkcjonujących w obszarze detalicznego rynku energii elektrycznej, zwłaszcza dla osób z obszaru biznesowego	15.05.2024 r. w godz. 9.00-17.00	stacjonarnie w siedzibie PSE w Konstancinie-Jeziornie oraz on-line na platformie ClickMeeting	
Spotkanie informacyjne poświęcone aktualizacji IRiESP-OIRE, w tym jej załączników	22.05.2024 r. w godz. 10.00-12.00	on-line, na platformie ClickMeeting	
Systemy informacyjne - współpraca z CSIRE	19.06.2024 r. 16.10.2024 r.	stacjonarnie w siedzibie PSE w Konstancinie-Jeziornie oraz on-line na platformie ClickMeeting	
Migracja danych inicjalnych CSIRE	25.09.2024 r.	on-line na platformie ClickMeeting	

Zapisy na szkolenia będą uruchamiane na 14 dni przed datą szkolenia. O szczegółach będziemy Państwa informować w komunikatach na stronie www.pse.pl/oire.



OIRE i CSIRE – źródła bieżących informacji

Strona internetowa OIRE: www.pse.pl/oire

- ⇒ Aktualności i informacje na temat OIRE
- ⇒ Harmonogram prac
- ⇒ Dokumenty wdrożeniowe
- ⇒ Formularze
- ⇒ Proces Migracji Danych
- ⇒ FAQ

Newsletter OIRE

- ⇒ Zachęcamy do zapisania się do newslettera OIRE – formularz zgłoszeniowy dostępny jest na dole serwisu: www.pse.pl

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA  

Dołącz do newslettera

Adres e-mail

Kategorie newslettera (Wymagany)

Wybierz wszystkie

Stopnie zasilania

OIRE

Konsultacje

Komunikaty OSP

Aktualności

| Projekt wdrożenia CSIRE



OIRE@PSE.PL

Andrzej Zadworny | Łukasz Kowalski | Łukasz Żółek | Piotr Brzeziński | Łukasz Kowalczyk

Beata Odoszewska | Paweł Modelski | Michał Kuliński | Aleksander Wiliński

CSIRE w pigułce | Konstancin-Jeziorna | ClickMeeting | 17 kwietnia 2024 r.

oire@pse.pl
